

모비스_PLM_생기 포털 고도화_제안서

2026. 07. 30 (목)

주식회사 테이아

I. 업체현황

1. 일반현황
2. 경영 상태
3. 조직 및 인원
4. 주요 프로젝트 실적 현황

II. 구축 사례

1. 모비스 생기 포털 구축
2. 모비스 PLM 구축
3. PLM SM 수행 요구사항 개발
4. 생기 포털 SM 수행 요구사항 개발
5. HYUDAI/KIA 스마트 TAG 시스템 구축

III. 프로젝트 추진방안

1. 적용 개발 방법론
2. 시스템 구축 방안
3. 프로젝트 관리 방안
4. 추진 일정 관리
5. 주요 산출물
6. 품질 보증 계획
7. 사업 수행 조직 및 업무 분장
8. 상세 인력 관리

I. 업체 현황

1. 일반 현황

I. 업체 현황

■ 업체 일반

회사명	주식회사 테이아
설립일	2015년 3월
대표이사	이춘재
직원 수	135명 (2026년 7월 기준)
사업분야	▪ 제조 AI 솔루션 개발 및 공급 ▪ AI 팩토리 엔지니어링 컨설팅 ▪ 스마트 팩토리 OT 플랫폼 개발 및 공급
주소	경기도 과천시 과천대로7길 33 디테크타워 B동 303,304,312호
전화번호 / 팩스	02-6390-6233 / 02-6390-6224
홈페이지	teia.co.kr

■ 연혁

2015	(주)테이아 창립 스마트팩토리 구축 사업 개시
2017	경남대학교 LINC 체결 SPAS(제조현장 IoT플랫폼) SW 판매/사업 개시
2018	IoT Device (Gateway, Tag) 사업 개시 기아차 국내 H공장 스마트태그 시스템 구축 기아차 해외 S공장 스마트태그 시스템 구축
2019	기아차 해외 I공장 스마트태그 시스템 구축 이노비즈 인증 획득
2020	명지대 교육용 스마트공장 구축 H중공업사 산업차량 공장 RTLS 적용 현대오트வே SPAS(OT 플랫폼) 라이선스 납품 기아차 국내 H공장 스마트태그 시스템 구축
2021	현대트랜스리드 스마트태그 시스템 구축 현대차 국내 U공장 스마트태그 시스템 구축 현대모비스 국내 J/K/U공장 스마트태그 시스템 구축
2022	ESG 우수 중소기업(동반성장위원회) 선정 현대글로벌비스 로봇배송서비스 관리시스템 구축 기아 국내 H/G공장 스마트태그 서비스 확대 적용 현대차 국내 A공장 스마트태그 시스템 구축
2023	현대차 국내 J공장 버스라인 스마트태그 시스템 구축 현대차 해외 혁신공장 클라우드 기반 작업지시 및 안전관제 플랫폼 구축
2024	현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 스마트태그 시스템 구축
2025	KeIT 주관 ‘AI 팩토리 전문기업 인증’ 선정

■ 최근 3개년 매출현황 및 손익규모

단위 : 백만원

구분	2023	2024	2025	CAGR
매출액	10,448	13,444	17,823	30.6%
경상이익	1,064	1,437	1,569	21.4%
경상이익률(%)	10.2%	10.7%	8.8%	
영업이익	1,169	1,432	1,544	14.9%
영업이익률(%)	11.2%	10.7%	8.7%	
당기순이익	1,012	1,393	1,505	22.0%
당기순이익률(%)	9.7%	10.4%	8.4%	

※ CAGR : Compound Annual Growth Rate (연평균 복합 성장률)

■ 조직도



4. 주요 프로젝트 실적 현황

I. 업체 현황

적용시점	적용 공장	적용 내용	사업 규모(백만 원)
2022년	광명1공장	스마트태그 시스템 적용	1,187.8
2022년	화성1공장	검사성적서 스마트태그 적용	116.3
2022년	광주1공장, 광주2공장	스마트태그 시스템 확대 적용	1,566.6
2022년	화성3공장	의장 스마트태그 운영시스템 구축	1,149.2
2021년	아산공장	브레이크튜브 스마트태그 시스템 구축	80.3
2021년	HMMI	체결보증이력관리 시스템 적용	304.8
2021년	화성3공장	체결보증이력관리 시스템 적용	186.6
2021년	화성2공장	체결보증이력관리 시스템 적용	157.6
2021년	울산51공장	스마트태그 시스템 적용	772.6
2021년	천안GLC	교보재관리 시스템 스마트태그 적용	371.5
2021년	광주3공장	체결보증 서버 스마트태그 시스템 개조	130.6
2020년	화성1공장	스마트태그 오프라인 적용	340.6
2020년	현대트랜스리드(티후아나)	스마트태그 시스템 적용	621.7
2020년	울산41,42,52	체결보증 서버 스마트태그 시스템 개조	238.8
2020년	광주2공장	체결보증 서버 스마트태그 시스템 개조	134.0
2020년	광주1공장	체결보증 서버 스마트태그 시스템 개조	133.3
2019년	KMI	스마트태그 시스템 적용	423.8
2019년	모비스 PLM 구축	PLM 시스템 구축 적용	
2017년	모비스 생기 포털	생기 포털 시스템 구축 적용	

4. 주요 프로젝트 실적 현황

I. 업체 현황

적용시점	적용 공장	적용 내용	사업 규모(백만 원)
2025년	광명1공장	체결보증 시스템 확대 적용	885.1
2025년	아산공장	의장 SOTT-체결공정 확대 및 추가 연계	906.3
2025년	울산4공장	스마트태그 시스템 적용	1,550.3
2025년	울산3공장	스마트태그 시스템 적용	3,210.9
2025년	울산2공장	스마트태그 시스템 적용	2,922.0
2025년	전주 트럭2.3공장	스마트태그 시스템 적용	1,643.9
2025년	경남조선해양	디지털 플랫폼 구축	639.3
2024년	울산51공장	스마트태그 시스템 공정 확대	208.1
2024년	화성2공장	스마트태그 시스템 확대 적용	210.5
2024년	화성EVO	스마트태그 시스템 적용	2,004.4
2024년	화성1공장	스마트태그 시스템 확대 적용	238.4
2024년	광주3공장	모바일성적서 연계	449.7
2024년	HMGMA	스마트태그 시스템 적용	2,470.1
2023년	울산51공장	스마트태그 시스템 확대 적용	210.7
2023년	광주3공장	스마트태그 시스템 적용	1,019.4
2023년	화성2공장	스마트태그 시스템 적용	1,423.2
2023년	전주 버스공장	스마트태그 시스템 적용	587.6
2023년	광명2공장	스마트태그 시스템 적용	1,877.4
2023년	광주1공장	스마트태그 시스템 적용	1,417.2



II. 구축 사례

1 모비스 생기 포털 구축

고객명	모비스	인원 / 비용	49 M/M
기간	구축 : 2015.06 ~ 2015.11, 개선 ; 2017.04 ~ 2017.10	전사 대상 적용	○

Customer Needs	구현내역 및 개선효과
1. 생산기술 본부 Portal 구축 : 생산기술본부 시스템 접속 경로 단일화 필요 : 통합결재 및 통합 검색 기능 구축 : 생산기술본부 공통 마스터 코드(공장/라인/차종 등) 관리 및 반영 2. 업무시스템 통합기반 구축 : 분산된 다수의 생산기술 시스템 통합 기반 구축 : 시스템별 분산된 정보를 통합 구축하여 업무 프로세스와 IT 시스템 연계성 확보 : 생산기술본부 통합 업무 지원 환경 확보 3. 생산기술본부 IT 통합 구축 : SOA 기반의 통합 아키텍처 및 환경 구축 : 주요 기능의 서비스화를 통한 재활용성 향상 : 조직간의 협업 개발 환경 구축 (사내, 파트너, 협력사 등)	1. 생산기술 포털 시스템 구축 : AutoONE 환경을 활용한 포털 구성 : AutoWAY, AutoONE 등 현대자동차 기간 시스템과의 SSO 연계 구성 : Workspace 메뉴 재구성 : Mypage, 커뮤니티 별도 구성 2. HW/SW 구성 : AutoONE 장비를 활용한 Container 별도 구성(Container 5~8) : AutoONE SW를 활용 (커뮤니티, Miplatform, Chart, 업로드 컴포넌트, OZ 리포트, Namo Web Editor 등) : 생산기술 전용 DB Instance 분리 3. 표준화 구축 : 공통코드 및 마스터 데이터 생성 및 적용 - 차종, 공장, SHOP, 라인 표준 마스터 생성/적용 - 명명규칙, Mapping Table 표준화 : 개발 및 기능 표준화 - 생기전용 통합개발가이드 작성 - 화면 UI / 아이콘 등 디자인 표준화 4. 기 구축 시스템 이관 : AutoONE 내 구축된 생기 시스템의 안정적인 분리 및 이관 : DB Instance 생성을 통한 데이터 이관 : 시스템별 시스템 코드 분류체계 구축 : I/F 변경 및 안정적 연계 : 생산기술 공통 마스터 정보 생성 및 반영

2 모비스 PLM 구축

고객명	모비스	인원 / 비용	78 M/M
기간	1차 : 2017.11 ~ 2018.11, 2차 : 2019.01 ~ 2019.11	전사 대상 적용	○
Customer Needs		구현내역 및 개선효과	
1. 기존 시스템 통합 : 표준 UI/UX 적용을 통한 통일성 요구 : PLM 공통기능 적용을 통한 결재 및 통합 권한 관리 필요 2. 통합정보 조회 : 필요한 정보 확인을 위해 다수의 업무시스템 접속으로 인한 정보의 위치 파악 제약 3. PMS(리소스/개발비 및 성과관리 체계) : 리소스/투자비/개발비 관리 미흡으로 프로젝트 성과/예측 부족 4. 대시보드(자원현황, 단위업무현황) : 시스템별 현황관리로 인한 정보 유무 파악 어려움 : 제품개발 현황 통합정보 제공 시스템 부재		1. 기존 시스템 통합 : PLM 시스템과 연계된 연구소 부문 시스템의 표준 UI/UX 적용 및 PLM 공통기능 적용 :결재, 알림, 사용자정보, 권한 등 주요 공통 기능 적용 :공통코드, DB Character SET 변경(UTF8)HW/SW 구성 2. 통합정보 조회 : 산재된 정보를 차종/제품분류/품번/EO 중심으로 필요한 정보를 연결하여 업무 편의성 제공 : 필요한 정보의 검색 시간 대폭 절감 : 시스템 정보 무결성 확보 및 활용성 증대 : 단일 통합 정보 조회 개발 3. PMS(리소스/개발비 및 성과관리 체계) : 프로젝트별 리소스의 관리를 통해 Portfolio 분석의 기초자료 제공 : 신규 프로젝트를 대비한 리소스 예측 모델의 활용 체계 구축 : 성과관리체계를 구축하여 프로젝트의 평가 자료 제공 4. 대시보드(자원현황, 단위업무현황) : 직관적인 UI 및 사용자 맞춤형 정보 선별 제공 → 정보 활용 증대 : 업무 진행현황 레포팅 제공 → 업무 지연 방지 : 수기 관리 업무 전산화 → 관리 공수 절감	

3 PLM SM 수행 요구사항 개발

고객명	모비스	인원 / 비용	84 m/m
기간	2017.01 ~ 2025.12	전사 대상 적용	○
Customer Needs		구현내역 및 개선효과	
- 현업 VoC와 통합계열사 운영정책 변화를 반영하여, 사용자 경험과 보안 · 권한 · 결재 프로세스를 동시에 고도화 필요. - 포틀릿 가독성, 디지털 보안서약, 참조문서 노출 시점, 권한 · REST 연계 등 핵심 운영 기능에 대한 체계적인 개선이 요구. - 포틀릿 내 즐겨찾기 · 최근메뉴의 시인성이 낮아 주요 기능 접근성이 제한됨 - 보안서약 제출이 분산 처리되어 사용자 인증과 이력관리의 효율성이 낮음 - 결재문서 참조함 반영 시점과 권한 전송 체계가 일관되지 않아 사용자 혼선 발생 - 사용자검색 팝업 정보가 제한적이어서 업무 처리 속도와 정확도가 저하됨		- 포틀릿 UI를 재정비하여 자주 사용하는 기능의 가시성과 접근성을 강화 - 디지털 보안서약 전자화 및 이메일 인증 기반 이력관리 체계 구현 - 결재 완료 시점 기준으로 참조문서가 정확히 반영되도록 프로세스 개선 - GHC 권한 및 코스트센터 REST 연계를 강화하고, 사용자검색 팝업 정보를 확장하여 업무 편의성 제고	

4 생기 포털 SM 수행 요구사항 개발

고객명	모비스	인원 / 비용	12 m/m,
기간	2025.01 ~ 2025.12	전사 대상 적용	○
Customer Needs		구현내역 및 개선효과	
■ 운영 중 누적된 현업 개선 요청을 신속하게 반영하여, 결재·조회·데이터 정합성·작성 편의성을 동시에 향상시키는 유지보수형 고도화 필요. - 실제 사용빈도가 높은 업무 화면을 중심으로 즉시 적용 가능한 개선효과를 확보하고, 후속 운영 안정성까지 고려한 개선 수행. • 공정배치 결재 참조 메일 체계가 미흡하여 승인 지연 가능성이 존재 • 안양 모듈공장 라인 분리 및 편성효율 집계 기준이 부족하여 데이터 활용성이 제한됨 • 유틸설비 조회 건수, 완료보고 결재선, 작성자 변경 등 운영 편의 기능이 충분하지 않음 • 반복 업무에 대한 화면·권한·결재 처리의 일관성이 부족하여 사용자 피로도가 높음		• 현재 결재자 대상 자동 메일 발송으로 승인 리드타임을 단축 • 라인 분리 및 편성효율 집계 로직을 개선하여 데이터 정합성과 활용도를 강화 • 유틸설비 조회 확대, 필수 결재선 반영, 작성자 변경 지원으로 업무 유연성 확보 • 운영관점에서 유지보수성이 높은 구조를 적용하여 후속 개선 요청 대응력을 제고	

5 HYUNDAI/KIA 스마트 TAG 시스템 구축

고객명	HYUNDAI/KIA	인원 / 비용	m/m,
기간	2025.01 ~ 2025.12	전사 대상 적용	○

Customer Needs

- 운영 중 누적된 현업 개선 요청을 신속하게 반영하여, 결재 · 조회 · 데이터 정합성 · 작성 편의성을 동시에 향상시키는 유지보수형 고도화 필요.
- 실제 사용빈도가 높은 업무 화면을 중심으로 즉시 적용 가능한 개선효과를 확보하고, 후속 운영 안정성까지 고려한 개선 수행.

현장 운영 관점

S-PAS Interface PLC			
TEIA Co., Ltd			
태원PLC	서브PLC1	서브PLC2	서브PLC3
Type	Description	Date	
CoreApp -> PLCApp	INFO	2019-11-21 10:53:02	
BodyNo0	DJF 889024	INFO	2019-11-21 10:53:05
BodyNo01	ENV 199538	INFO	2019-11-21 10:53:05
BodyNo02	CSZ 634433	INFO	2019-11-21 10:53:05
BodyNo03	CSZ 634425	INFO	2019-11-21 10:51:48
BodyNo04	CSW 634409	INFO	2019-11-21 10:51:48
BodyNo05	CSZ 634391	INFO	2019-11-21 10:51:48
BodyNo06	CSW 634398	INFO	2019-11-21 10:50:34
BodyNo07	CSZ 634395	INFO	2019-11-21 10:50:33
ReceivedTime	20191121105300	INFO	2019-11-21 10:50:33
PLC -> PLCApp	INFO	2019-11-21 10:50:33	
LineSignal	INFO	2019-11-21 10:49:23	
LineSignalTime	INFO	2019-11-21 10:49:22	
PushSignal	INFO	2019-11-21 10:49:22	
PLCApp -> CoreApp	INFO	2019-11-21 10:49:19	
LineSignalToCon	INFO	2019-11-21 10:49:12	
PLCApp -> PLC	INFO	2019-11-21 10:49:12	
ToolCompleteSig	INFO	2019-11-21 10:47:06	
WinPLCTimeSys	20191121105351	INFO	2019-11-21 10:47:01
WinSequenceT	20191121105382	INFO	2019-11-21 10:46:53
PLCInfo	INFO	2019-11-21 10:46:50	
ProcCd	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo00	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo01	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo02	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo03	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo04	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo05	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo06	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo07	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo08	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo09	INFO	2019-11-21 10:46:50	
BodyNo10	INFO	2019-11-21 10:46:50	

구현내역 및 개선효과

구축 적용 관점

CMT				Body No		
1.62				0003	TIW 038544	
				Spec		
				0002	TIW 038004	LHD
				0003	TIW 038544	RHD
				0004	TIW 038527	RHD
				0005	TIW 038521	RHD
				0006	TIW 038461	RHD
				Interlock		
				Home	Select	Clear

도입 전 운영 한계

- 바코드 리딩 중심 구조로 공정별 수동 확인과 누락 가능성이 상존
- 작업 시점과 이동 경로의 실시간 추적 한계

개선 필요 포인트

- 생산지시 · 설비 · 현장 데이터의 통합 운영 필요
- 공정 진입 판단과 이력 관리의 자동화 요구 증대

실시간 추적

공정 연계

이상 감지

데이터 분석

주요 구축 내용

- Smart Tag / RTLS 기반 위치 · 공정 추적 체계 구축
- 설비 신호와 생산지시 연계 기반 자동 운영 지원

구축 효과

- 실시간 모니터링과 이상 감지로 운영 가시성 강화
- 축적 데이터 기반 공정 최적화와 운영 표준화 지원

III. 프로젝트 추진방안

체계적인 개발 접근, 안정적 전환, 납품 수준의 품질 확보를 기준으로
신규 2개 영역과 기능개선 88건을 단계적으로 수행하겠습니다.

기존 운영 중인 PNDES 기반을 최대한 재사용하면서도 신규 2개 영역과 기능 개선 88건을 안정적으로 구현하기 위해, 분석-설계-개발-검증-오픈이 끊기지 않는 고도화 중심 방법론 적용.



* CBD : Component Based Development

1-1. 요구사항 분석 및 개발 방안

III. 프로젝트 추진방안

제안요청서, 생기 프로젝트 정리 자료, 상세 개선항목 자료를 기준으로 요구사항을 신규 개발 · 기존 기능 개선 · 연계/데이터 · 권한/운영 관점으로 재구성하고, 승인 가능한 분석 산출물로 구체화하여 개발 반영.

<테이아 소속 기존 생기 포털 구축에 참여 경험이 있는 인원과 현 운영 팀 인원의 지원을 받아 빠른 분석과 필요에 따른 지원을 받아 안정적으로 진행 가능>

01

현행 분석

- 기존 PNDES 메뉴 · 권한 · 데이터 구조 확인
- 운영 화면 · DB · 연계 현황 파악

02

요구사항 구조화

- 신규 2개 영역 + 개선 88건 체계화
- 공통 · 프로젝트 · 조공법 업무로 분류

03

상세 설계

- 화면 흐름 · 기능 정의 · 가공 테이블 설계
- 메일 · 첨부 · 권한 정책 반영

04

개발 우선순위화

- 업무효과 · 난이도 기준으로 구현 순서 확정
- 단계별 오픈 가능 범위 설정

05

검증 / 승인

- 요구사항-설계-개발-시험 추적관리
- 리뷰 · 시연 · 결함 조치 후 기준선 확정

요구사항 관리 원칙

- 기존 운영 기능과 충돌 여부를 선택 인하여 회귀 리스크 최소화
- 사용자 관점의 화면 · 권한 · 메일 흐름을 함께 검토
- 개선 요청은 기능 단위가 아닌 업무 시나리오 단위로 구체화

주요 산출물

- 현행 분석서 / 요구사항 정의서 / 화면설계서
- 데이터 가공 테이블 정의 / 권한 · 연계 설계서
- 개선항목 추적표와 우선순위 관리표

승인 체계

- 분석 결과는 현업 검토 후 개발 기준선으로 확정
- 변경 요청은 영향도 검토 후 공식 절차로 반영
- 중요 항목은 단계별 리뷰 회의를 통해 조정

자동화 현황 영역은 기존 부품공정배치/모듈 공정배치 데이터를 재활용하되, 조회 성능과 활용성을 높이기 위해 가공 테이블과 대시보드형 화면을 별도로 구성하여 “현황 조회 → 상세 분석 → 공유/전송” 흐름 구현.

구성 메뉴 / 화면

- 자동화 현황 대시보드
- 부품 공정 자동화 현황 / 모듈 공정 자동화 현황
- 상세 · 조건 검색 / 메일 · 엑셀 공유

데이터 처리 방식

- 기존 DB 데이터 호출
- 조회 목적의 가공 테이블 설계
- 집계 기준 표준화 및 인덱스 적용

업무 기능 구현

- 등록 / 수정 / 삭제 및 상세 조회
- 조건별 필터 · 정렬 · 엑셀 다운로드
- 메일 공유 및 이력 관리

기존 DB 호출

가공 테이블 적재

대시보드 시각화

상세 조회 / 검색

메일 · 엑셀 공유

UI / UX 관점

- 대시보드 → 리스트 → 상세 페이지 → 전송 흐름으로 직관적 구성
- 통합 검색과 상태 기준 필터를 제공하여 빠른 탐색 지원
- 그래프 · 현황 수치 · 상세 리스트 간 연결성 확보

성능 / 운영 관점

- 빈번한 조회 항목은 가공 테이블과 인덱스 기준으로 설계
- 관리자/일반 사용자 권한 분리 및 메일 이력 관리 적용
- 운영 데이터 영향 최소화를 위한 배치 · 조회 정책 반영

1-3. 신규 PAGE(중장기 방향성 공유) 개발 방안

III. 프로젝트 추진방안

중장기 방향성 공유 영역은 mTRM, 기술과제, 기술공유 데이터를 통합적으로 관리하는 구조로 개발하며, 로드맵·캘린더·첨부 미디어·상세보기·메일 공유 기능을 결합하여 “등록 → 검색 → 시각화 → 공유” 체계 구현.

핵심 업무 모듈

- 통합 로드맵 / 상세 과제 로드맵
- mTRM 협의체 / 관리 항목 정보
- 기술공유 자료 등록 및 조회

화면 및 시각화 방식

- 대시보드 + 리스트 + 상세 View 구조
- 로드맵은 캘린더 / 타임라인 방식 지원
- 상태 · 기간 · 분과별 조건 검색 제공

개발 세부 포인트

- 첨부파일 미리보기 / 썸네일 생성 정책 반영
- 메일 공유 · 권한 제어 · 변경 이력 관리
- 과제-로드맵-공유자료 간 연계 조회 지원

등록

검색

시각화

상세 확인

공유

mTRM / 기술과제 개발 접근

- 통합 · 상세 로드맵 간 연계 구조 수립
- 과제별 속성, 기간, 담당 분과 기준 표준화
- 차트/리스트 간 Drill-down 흐름 구현

기술공유 개발 접근

- PPT · 문서 · 이미지 · 영상 업로드/조회 기능 구현
- 썸네일과 상세 보기, 메일 공유 기능 제공
- 권한 정책 및 첨부 보안 기준 동시 적용

기대 효과

- 중장기 기술 방향성의 체계적 축적 · 공유
- 현업의 빠른 정보 검색과 협업 효율 향상
- 기술과제와 공유자료의 일관된 운영 기반 마련

1-4. 기능 개선 88건 개발 방안

Ⅲ. 프로젝트 추진방안

기능 개선 88건은 단순 개별 수정이 아닌, 공통 패턴을 묶어 화면 / 권한 / 데이터 / 업로드 / 검색 / 메일 / 결재 로직까지 함께 정비하는 방식으로 개발하여 재작업과 회귀오류 최소화.

공통 / 결재 / 메일

- 결재라인 · 대결자 · 메일알림 · 번역 · 메인화면 UI
- 결재자 자동지정 및 승인 흐름 개선

프로젝트 / 이벤트

- 프로젝트 생성 · 중단 · 다차중 처리
- 이벤트 제목 · 담당자 · 산출물 처리 고도화

조립공법서

- 복사 오류 · 공수 계산 · 품번 검색 · 엑셀 업로드 보완
- 작성 편의성 및 데이터 정확성 강화

기준정보 / 라인관리

- 혼류차중 · CAPA · 기준정보 · 운영자료 첨부 개선
- 계산 로직 표준화 및 관리성 강화

업무지표 / 과제관리

- 수익성/활동성 · 계획실적 · 검색조건 · 매뉴얼 조회 개선
- 과제 유형별 관리 편의성 강화

운영 품질 / 회귀관리

- 기존 기능 영향도 · 이력관리 · 관리자 기능 보완
- 개선 항목별 회귀시험과 운영 안정성 확보

패턴 분석

공통 로직 설계

우선 순위 개발

회귀시험

운영 반영

2. 시스템 구축 방안 – 시스템 시험방안

Ⅲ. 프로젝트 추진방안

신규 메뉴와 기능 개선 항목의 특성을 반영하여 단계별 시험 기준을 사전에 정의하고, 데이터 정합성 · 업무 시나리오 · 운영 안정성까지 연결된 입체형 시험 체계 운영.

01

단위 시험

- 화면 / 등록 / 조회
- 필수값 · 권한 · 예외처리

02

연계 시험

- PLM · 기존 D B 호출
- 가공 테이블 정합성

03

통합 시험

- 메뉴 간 흐름 · 검색 · 첨부
- 회귀 영향도 확인

04

사용자 시험

- 현업 시나리오 검증
- 업무 편의성 점검

05

오픈 점검

- 배포 · 권한 · 백업 확인
- 초기 장애 대응 준비

중점 검증 대상

- 자동화 현황
- 중장기 방향성 공유
- 결재 / 메일 / 권한
- 엑셀 업 · 다운로드

결함관리 기준

- 중요도 분류
- 원인 추적
- 재시험 후 Close
- 미해결 항목 통제

승인 기준

- 시험 결과서
- UAT 확인
- 오픈 체크리스트

검증 Coverage

- 화면 · 데이터 · 권한 · 연계 전 영역을 포함한 체계적 시험
- 개선 항목별 테스트 케이스와 회귀검증 수행

결함 Control

- 등록 → 조치 → 재시험 → 승인 흐름의 이력 관리
- 주요 이슈는 주간 회의체를 통해 즉시 공유 · 대응

운영 Readiness

- 배포 · 권한 · 백업 · 안정화 항목을 사전 점검
- 오픈 직후 초기 장애 대응 체계를 운영

※ 시험 결과는 결함관리 이력과 연계하여 관리하며, 주요 항목은 고객 검토 및 승인 절차를 통해 오픈 적합성을 확보합니다.

2-1. 시스템 구축 방안 – 보안 취약점 대응 방안

III. 프로젝트 추진방안

인력 · 권한 · 소스코드 · 첨부파일 · 운영 인프라 전 영역에 대해 보안 대책을 수립하고, 신규 파일 등록/조회 기능과 기존 운영 데이터 보호를 위한 예방 · 점검 · 탐지 · 조치 체계 적용.



예방

정기 점검

이상 탐지

즉시 조치

결과 보고

3. 프로젝트 관리 방안

III. 프로젝트 추진방안

본 사업은 신규 기능 2건 + 기능개선 88건 + 기존 운영 연속성 확보가 핵심인 만큼, 범위 · 일정 · 품질 · 이슈 · 의사소통을 통합 관리하는 8대 프로젝트 관리 체계 적용.

범위관리

- 요구사항 기준선 수립
- 신규 · 개선 항목 추적관리

일정관리

- 주간 단위 진척관리
- 마일스톤 점검

품질관리

- 산출물 리뷰 · 시험
- 품질 Gate 운영

이슈 / Risk

- 중요 이슈 즉시 보고
- 대응계획 및 일정 반영

의사소통

- 주간 보고 / 회의체 운영
- 의사결정 이력 관리

형상관리

- 소스 · 문서 버전관리
- 배포본 이력 통제

변경관리

- 요구사항 변경 영향도 검토
- 승인 후 일정 · 공수 반영

전환 / 안정화

- 배포 · 권한 · 백업 확인
- 초기 장애 집중 대응

운영 리듬

- 주간 진행회의로 일정 · 이슈 점검
- 월간 Steering Committee로 주요 의사결정 공유

통제 체계

- 변경 요청은 영향도 검토 후 공식 승인 절차로 반영
- 중요 결함 및 리스크는 별도 관리대장으로 통제


성과 지향 관리

- 일정 준수와 품질 확보를 동시에 관리
- 오픈 안정화와 인수인계까지 종료 기준으로 운영

4. 추진 일정 관리

III. 프로젝트 추진방안

예상 수행 기간은 2026년 8월 ~ 2027년 01월 월이며, 요구사항 확정 → 설계 → 개발 → 통합시험 → 오픈 안정화 순으로 단계별 마일스톤 관리

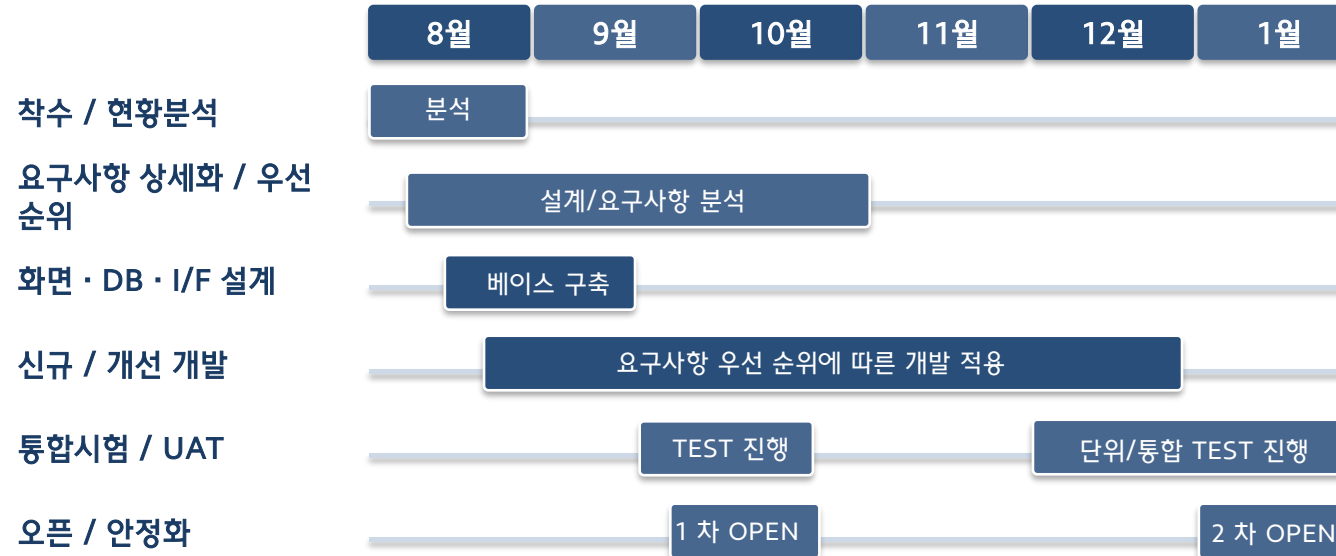

주요 마일스톤

- Kick-off
- 요구사항 확정
- 설계 완료

개발 / 시험

- 핵심기능 개발 완료
- 통합시험 / UAT
- 결함 조치 완료

오픈 / 안정화

- 배포 승인
- 사용자 교육
- 초기 안정화 지원

고객 표준 문서 체계에 맞춰 단계별 산출물을 작성·검토·승인하며, 운영 및 유지보수 관점의 인수인계 자료까지 포함하여 제공.

착수

- 착수보고서
- WBS / 일정계획
- 회의체 운영계획

분석

- 현행분석서
- 요구사항 정의서
- 개선항목 상세분석서

설계

- 화면설계서
- DB 설계서
- I/F 설계서
- 권한 / 보안 설계서

구현

- 프로그램 명세 / 개발내역서
- 단위 테스트 결과서

시험

- 통합시험 시나리오 / 결과서
- UAT 결과서
- 결함조치 내역

오픈 / 종결

- 배포계획서
- 운영자 매뉴얼
- 교육자료
- 최종보고서

착수

분석

설계

구현

시험

오픈 / 종결

6. 품질 보증 계획

III. 프로젝트 추진방안

요구사항 적합성, 개발 품질, 데이터 정합성, 운영 안정성을 핵심 품질지표로 설정하고 단계별 검토와 결함관리, 고객 검증을 연계한 품질보증 체계 운영.

요구사항 품질

- 반영률
- 누락 방지
- 승인 이력

개발 품질

- 코드 점검
- 단위시험
- 형상관리

데이터 품질

- 정합성
- 연계 검증
- 조회 정확성

운영 품질

- 배포 적합성
- 안정화
- 장애 최소화

품질관리 지표

- 요구사항 반영률
- 결함 조치율 / 재발 여부
- 시험 커버리지 및 승인 완료율
- 오픈 후 초기장애 최소화

결함관리 원칙

- 중요도 기준 분류 후 즉시 조치
- 원인-조치-재시험 이력 관리
- 미해결 결함은 오픈 전 고객 협의 · 통제

품질 Gate 운영

- 분석 / 설계 / 개발 / 시험 단계별 검토 수행
- 주요 산출물 리뷰와 승인 절차 연계
- 오픈 전 최종 품질 적합성 확인

검토

점검

보완

승인

오픈

7. 사업 수행 조직 및 업무 분장

III. 프로젝트 추진방안

사업 수행 일정은 2026.07 ~ 2027.01를 기준으로 하며, 고객사 지정 장소와 협업 환경을 병행하여 운영. 주간 / 월간 회의 Steering Committee를 통해 품질과 일정의 일관성 확보.

분야별 업무 분장

프로젝트 관리자

업무 추진 총괄 및 대내외 커뮤니케이션, 범위 · 일정 · 이슈 · 리스크 관리, 주요 산출물 승인 총괄

설계 / 개발 부문

요구사항 상세화, 화면 · DB · I/F 설계, 신규 2개 영역 및 88건 기능개선 구현, 데이터 연계 개발

개발 관리 부문

단계별 산출물 리뷰, 시험계획 · 결과 점검, 결함관리, 오픈 적합성 확인

기술지원 / 자문

기술 난제 검토, 아키텍처 · 표준 자문, 운영 안정화 및 주요 이슈 대응 지원

한영혁 부장 | 사업 관리

이승호 부장 | PM

설계 / 개발 부문

이주건 부장

개발 관리 부문

김철민 부장

기술지원 / 자문

민형식 이사

주간 운영

- 주간 진행회의 및 진척 · 이슈 점검
- 중요 이슈 즉시 공유 및 조정

월간 운영

- Steering Committee 보고
- 주요 의사결정 사항 공유

현장 / 협업 운영

- 고객사 지정 장소 + 협업 환경 병행
- 오픈 전후 집중 지원 체계 운영

프로젝트 범위와 예상 수행기간(2026.07~12), 총 투입공수 약 23 M/M 기준으로 핵심 인력을 배치하고, 단계별 피크 구간에 집중 투입하는 방식 운영.

구분	8월	9월	10월	11월	12월	1월	개별 공수	합계 공수	등급	수행 포지션
기획/설계(PM)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	5.0	23.0	특급	기획 설계, 주요 의사결정, 대외 협의 지원, 산출물 관리
디자인/퍼블리셔	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0		고급	화면 구현, UI/UX, 퍼블리싱 반영
개발1(선임)	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	5.0		특급	개발, 기술 난제 검토, 아키텍처 · 표준 자문
개발2(선임)	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	5.0		특급	현행 · 요구사항 분석, 화면 · DB · I/F 설계
개발3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	3.5		고급	신규 기능 및 개선 로직 구현, 데이터 연계 개발
개발4	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	3.5		고급	신규 기능 및 개선 로직 구현, 데이터 연계 개발

※ 상기 투입 계획은 제안 기준안이며, 최종 일정 · 우선순위 확정 후 고객 협의를 통해 조정 가능합니다.

THANK YOU

주식회사 테이아

Method

Quality

Security
